

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления
АО БАНК «СНГБ»

_____ **А.В. Король**

«_____» _____ **2020 г.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по выполнению монтажа автоматической системы газового пожаротушения в помещении центра обработки данных Административного здания АО БАНК «СНГБ», г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 19.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правления
_____ **С.Г. Кротов**

Начальник управления безопасности
_____ **И.Н. Стагнеев**

И.о. директора технологического блока
_____ **А.В. Герасименко**

Начальник административно-хозяйственного управления
_____ **Г.М. Хакимова**

г. Сургут
2020


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектной документации по выполнению демонтажа и монтажа автоматической системы газового пожаротушения (АСПТ) в помещении центра обработки данных (ЦОД) Административного здания АО БАНК «СНГБ», г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого 19.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Сведения о месте выполнения работ

1	Наименование (назначение) помещения	Центр обработки данных (ЦОД)
2	Длина, м	7,37
3	Ширина, м	6,6
4	Защищаемая площадь, м ²	48,64
5	Высота помещения общая, м	2,7
6	Высота фальшпотолка, м	0,4
7	Высота фальшпола, м	0,4
8	Объем помещения, м ³	150
9	Пределы темп-р, ° С	18-25
10	Высота над уровнем моря, м	≈ 50
11	Месторасположение модуля(ей)	Внутри защищаемого помещения
12	Перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;	А- Горение твердых веществ
13	Конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций	Вентиляция, балки, колонны.
14	Наличие и тип вентиляции	Кондиционирование
15	Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Д
16	Наличие людей их кол-во	-
17	Тип ГОТВ	Хладон, Novec 1230, CO ₂ , Азот.

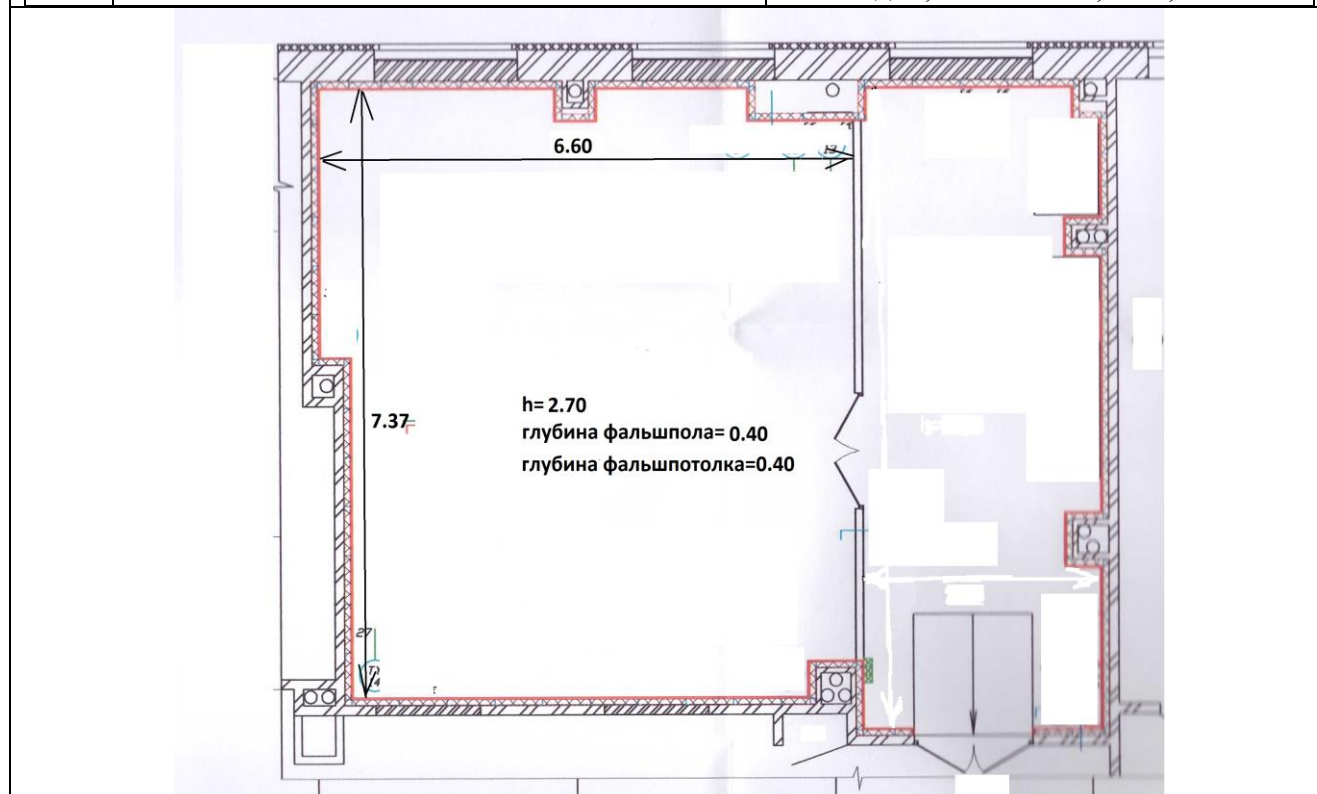

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР

Разработка проекта производства работ (далее - ППР) возлагается на проектную организацию, имеющую соответствующую лицензию. Стоимость разработки ППР включена в договорную цену. Разработка ППР должна выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт.

Выполнение любых работ на объекте без ППР, согласованных в установленном порядке с Заказчиком запрещено.

По факту утверждения ППР Заказчиком Исполнитель берет на себя обязательство по выполнению демонтажных и монтажных работ.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с:

- Законом о лицензировании, п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225;
- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011).

Подраздел 3.2 Состав работ

3.2.1 Состав работ:

- демонтаж установленной в ЦОД, выработавшей срок эксплуатации АСПТ;
- утилизация демонтированного оборудования;
- монтаж и ввод в эксплуатацию новой АСПТ.

Работа серверного оборудования в ЦОДе не будет приостановлена/отключена в ходе выполнения работ по замене АСПТ.

Действующие системы: СКУД, видеонаблюдение, система охранно-пожарной сигнализации здания (в том числе и в помещении ЦОД) при выполнении работ должны оставаться в рабочем состоянии;

Для контроля и управления, новую систему автоматического газового пожаротушения необходимо подключить на существующий системе управления пожаротушения.

Подраздел 3.3 Стоимость работ

Стоимость проектных работ рассчитывается и оформляется в виде локально-сметного расчета в базовых ценах, а также в текущих ценах. Сумма является твердой, не подлежит изменению.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения проектных: с момента подписания договора.

Окончание выполнения проектных работ: определяется тендерной процедурой.

Окончание выполнения монтажных работ: определяется тендерной процедурой.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 5.1. Последовательность приемки работ

Разработанная проектная документация передается Заказчику, в соответствии с условиями договора, на проверку и согласование. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Сметная документация предоставляется Заказчику в формате «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

Подраздел 5.2. Количество экземпляров проектной документации

Проектная документация разрабатывается и передается Заказчику в следующем количестве:

- подлинник, сшитый в альбомы, упакованный в папки - три экземпляра;

- копия подлинника в сшитом альбоме, упакованном в папки - один экземпляр;
- электронный вид документа (автокад и pdf) - один экземпляр направляется по электронной почте.
- электронный вид документа (автокад и pdf) – один экземпляр передается на флеш-накопителе.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	РД	рабочая документация
2.	Объект	Центр обработки данных (ЦОД). Административное здание АО БАНК «СНГБ», г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19
3.	ПД	Проектная документация по объекту
4.	ТЗ	Техническое задание.
5.	ПСД	Проектно-сметная документация
6.	ППР	Проект производства работ
7.	СНиП	Строительные нормы и правила
8.	СП	Свод правил
9.	ФЗ	Федеральный закон
10.	АСПТ	Автоматическая система пожаротушения
